



Plan de Emergencia Habitacional

2022 - 2025



Boletín a octubre 2024


Corte al 31.10.2024





VIVIENDAS TERMINADAS O ENTREGADAS

marzo 2022 a octubre 2024

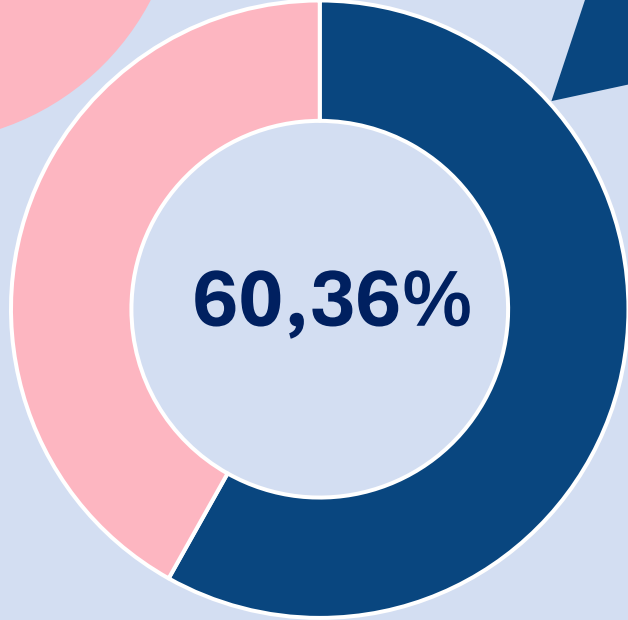

**Meta marzo
2026**

**Avance a octubre
2024**

260.000

Terminadas o entregadas

156.937

más de **100.000**

En ejecución

127.947

Consideraciones: Viviendas terminadas: DS 49 y DS 10: Recepción SERVIU/DOM/GLOSA 6/Art. 5.2.7 OGUC; DS 19: Recepción Municipal total y parcial; DS 01: Reporte SIGFE; DS 49 adquisición: Reporte SIGFE ; DS 120: Resolución subsidio asignado. Incluye Subsidios de arriendo permanentes para personas mayores y operaciones cursadas con FOGAES.



VIVIENDAS TERMINADAS O ENTREGADAS

marzo 2022 a octubre
2024

Servicio	Meta PEH	Viviendas terminadas o entregadas
Arica y Parinacota	7.540	3.314
Tarapacá	9.300	3.940
Antofagasta	17.400	4.965
Atacama	7.517	4.040
Coquimbo	12.490	8.344
Valparaíso	31.246	16.240
O'Higgins	14.667	9.220
Maule	16.667	15.640
Ñuble	6.557	6.121
Biobío	18.896	17.001
La Araucanía	13.533	13.293
Los Ríos	5.612	3.549
Los Lagos	14.165	9.814
Aysén	1.293	1.027
Magallanes	1.962	2.142
Metropolitana	81.155	38.287
Nacional	260.000	156.937



VIVIENDAS EN EJECUCIÓN SEGÚN AVANCE FÍSICO

% de avance físico						
Servicio	[0-25[[25-50[[50-75[[75-100[100%	Total
Arica y Parinacota	1.173	308	1.440	1.274	157	4.352
Tarapacá	2.535	28	1.078	386	271	4.298
Antofagasta	2.000	799	288	771	525	4.383
Atacama	1.917	602	351	836	136	3.842
Coquimbo	2.156	599	1.272	1.302	321	5.650
Valparaíso	5.437	1.747	1.797	3.259	1.752	13.992
O'Higgins	4.641	994	1.822	1.316	309	9.082
Maule	4.377	977	614	3.344	232	9.544
Ñuble	1.740	556	83	1.498	968	4.845
Biobío	2.723	1.947	1.873	2.858	717	10.118
La Araucanía	4.115	234	1.520	2.267	265	8.401
Los Ríos	635	232	310	990	17	2.184
Los Lagos	1.459	917	1.661	2.826	327	7.190
Aysén	8	287	75	30	129	529
Magallanes	277	394	437	1.273	64	2.445
Metropolitana	16.723	5.259	4.079	8.629	2.402	37.092
Nacional	51.916	15.880	18.700	32.859	8.592	127.947



VIVIENDAS EN PROCESO

Región	Viviendas terminadas o entregadas	Viviendas en ejecución	Viviendas por iniciar	Viviendas en proceso
Arica y Parinacota	3.314	4.352	1.697	9.363
Tarapacá	3.940	4.298	2.620	10.858
Antofagasta	4.965	4.383	4.844	14.192
Atacama	4.040	3.842	1.109	8.991
Coquimbo	8.344	5.650	4.889	18.883
Valparaíso	16.240	13.992	6.074	36.306
O'Higgins	9.220	9.082	3.031	21.333
Maule	15.640	9.544	3.308	28.492
Ñuble	6.121	4.845	2.393	13.359
Biobío	17.001	10.118	5.001	32.120
La Araucanía	13.293	8.401	4.077	25.771
Los Ríos	3.549	2.184	1.288	7.021
Los Lagos	9.814	7.190	5.516	22.520
Aysén	1.027	529	866	2.422
Magallanes	2.142	2.445	1.037	5.624
Metropolitana	38.287	37.092	22.221	97.600
Nacional	156.937	127.947	69.971	354.855
